



Séance publique

17 août 2026

Salle polyvalente de Chalais

SÉANCE PUBLIQUE

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

- › Agir dans une situation de crise
- › Donner une information officielle et transparente sur la situation
- › Permettre aux usagers de poser des questions

SÉANCE PUBLIQUE

AGENDA EN 2 PARTIES

Téléphérique actuel

- › Historique
- › Panne
- › Mesures mises en place

Nouveau téléphérique

- › Historique
- › État des procédures
- › Prochaines étapes

TÉLÉPHÉRIOUE ACTUEL

GÉNÉRALITÉS

- › Clientèle de l'installation
 - › Elèves (Vercorin vers le bas et Chalais vers le haut)
 - › Habitants
 - › Sportifs (Dérupe, parapentes, skieurs ...)
 - › Pendulaires et hôtes du village touristique
- › Données de trafic
 - › 57 courses/jour, soit 21'000/an ou 40'000 km
 - › Depuis 2019, 260'000 km et depuis 2000, 1 mio de km
- › Concession attribuée jusqu'en 2034

TÉLÉPHÉRIOUE ACTUEL

BREF HISTORIQUE

- › 1951 : Construction du téléphérique
- › 1989 : Rénovation majeure de l'installation
- › 2013 : Lancement du projet de renouvellement
Perspective de construction 2019
- › 2017 : Décision de financement du Grand Conseil valaisan
- › 2018 : Mise à l'enquête publique du projet
Blocage suite au dépôt d'oppositions
- › **Depuis lors, maintien de l'installation et du service**

TÉLÉPHÉRIOUE ACTUEL

INVESTISSEMENTS de MAINTIEN DEPUIS 2018

Année	Nature des travaux	Montant
2019	Armoire de commande et câble tracteur	CHF 200'000
2021	Révision cabines et chariots	CHF 210'000
2022	Changement des câbles porteurs + filtres	CHF 440'000
2023	Mise en conformité sécurité incendie	CHF 170'000
2025	Réfection moteurs suite incident (10/2025)	CHF 50'000
2026	Changement armoire de commande	*CHF 150'000
TOTAL		*CHF 1'220'000

TÉLÉPHÉRIOUE ACTUEL

POINT DE SITUATION

- › Problème moteur
 - › **Interruption du service le 29 juillet 2026**
- › Commande électrique actuelle très vétuste
 - › **Pièces de rechange plus produites**
 - › Réparation système actuel n'apporte aucune garantie de fiabilité

TÉLÉPHÉRIOUE ACTUEL

MESURES TECHNIQUES ENGAGÉES

- › Changement de la commande avec technologie actuelle
 - › Installation d'un variateur avec moteur asynchrone
- › Commande passée

Élément	Délai
Armoire électrique à cabler	12 semaines
Moteur asynchrone à commander	13 semaines

› **Remise en service de l'installation :** **Début décembre**

TÉLÉPHÉRIQUE ACTUEL

BUS DE SUBSTITUTION DÈS LE 20 AOÛT

Du lundi au dimanche, dès le 20 août 2026.			
LEGENDES :		Bus de ligne	
Transports Scolaires*		Bus supplémentaires	
Départ Chalais Téléphérique vers Briey puis Vercorin Poste		Départ Vercorin Poste vers Briey puis Chalais Téléphérique	
Lundi - Vendredi	Samedi-Dimanche	Lundi - Vendredi	Samedi-Dimanche
06:00		06:30	
06:41	06:41	07:06	07:06
07:30*		08:00	
08:08	08:08	08:37	08:37
11:10	11:10	11:40*	11:40
12:08	12:08	13:06	13:06
13:25		13:55*	
14:15		14:40*	
16:40		17:10	
17:08	17:08	17:37	17:37
18:00		18:30	
19:00	19:00	19:30	19:30
20:00		20:30	

- **Réponse à une situation de crise**
- Les abonnements téléphérique sont valables dans les bus
- Arrêts Briey de Chippis et Brieytchon desservis sur demande
- **Infos officielles sur www.vercorin.ch**

Du lundi au dimanche, dès le 20 août 2026.

LEGENDES :

Transports Scolaires*

**Départ Chalais Téléphérique
vers Briey
puis Vercorin Poste**

Lundi - Vendredi	Samedi-Dimanche
06:00	
06:41	06:41
07:30*	
08:08	08:08
11:10	11:10
12:08	12:08
13:25	
14:15	
16:40	
17:08	17:08
18:00	
19:00	19:00
20:00	

Bus de ligne

Bus supplémentaires

**Départ Vercorin Poste
vers Briey
puis Chalais Téléphérique**

Lundi - Vendredi	Samedi-Dimanche
06:30	
07:06	07:06
08:00	
08:37	08:37
11:40*	11:40
13:06	13:06
13:55*	
14:40*	
17:10	
17:37	17:37
18:30	
19:30	19:30
20:30	

QUESTIONS ?

NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

AVANCÉE DES PROCÉDURES (1/2)

Année	PAZ/RCCZ	Approbation des plans
	Commune	OFT par TCV
2018	Mise à l'enquête	Mise à l'enquête
	Oppositions	Oppositions
2019		Suspension de la procédure
2021	Homologation Conseil Etat	
	Recours au Tribunal Cantonal	

NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

AVANCÉE DES PROCÉDURES (2/2)

Année	PAZ/RCCZ	Approbation des plans
2022	Recours rejetés par TC	
	Recours au Tribunal Fédéral	
2023	Recours rejeté par TF	
2024		Reprise de la procédure par OFT
2024 à 2026		Actualisation du projet par TCV / Garaventa

NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

ILLUSTRATION POUR LE SAUVETAGE

1. Hélicoptère
2. Moteur de secours 1
3. Moteur de secours 2


Autre possibilité demandée (Option 4)

⇒ Sauvetage par le bas (> 100 m) 


⇒ Moteur par récupération 







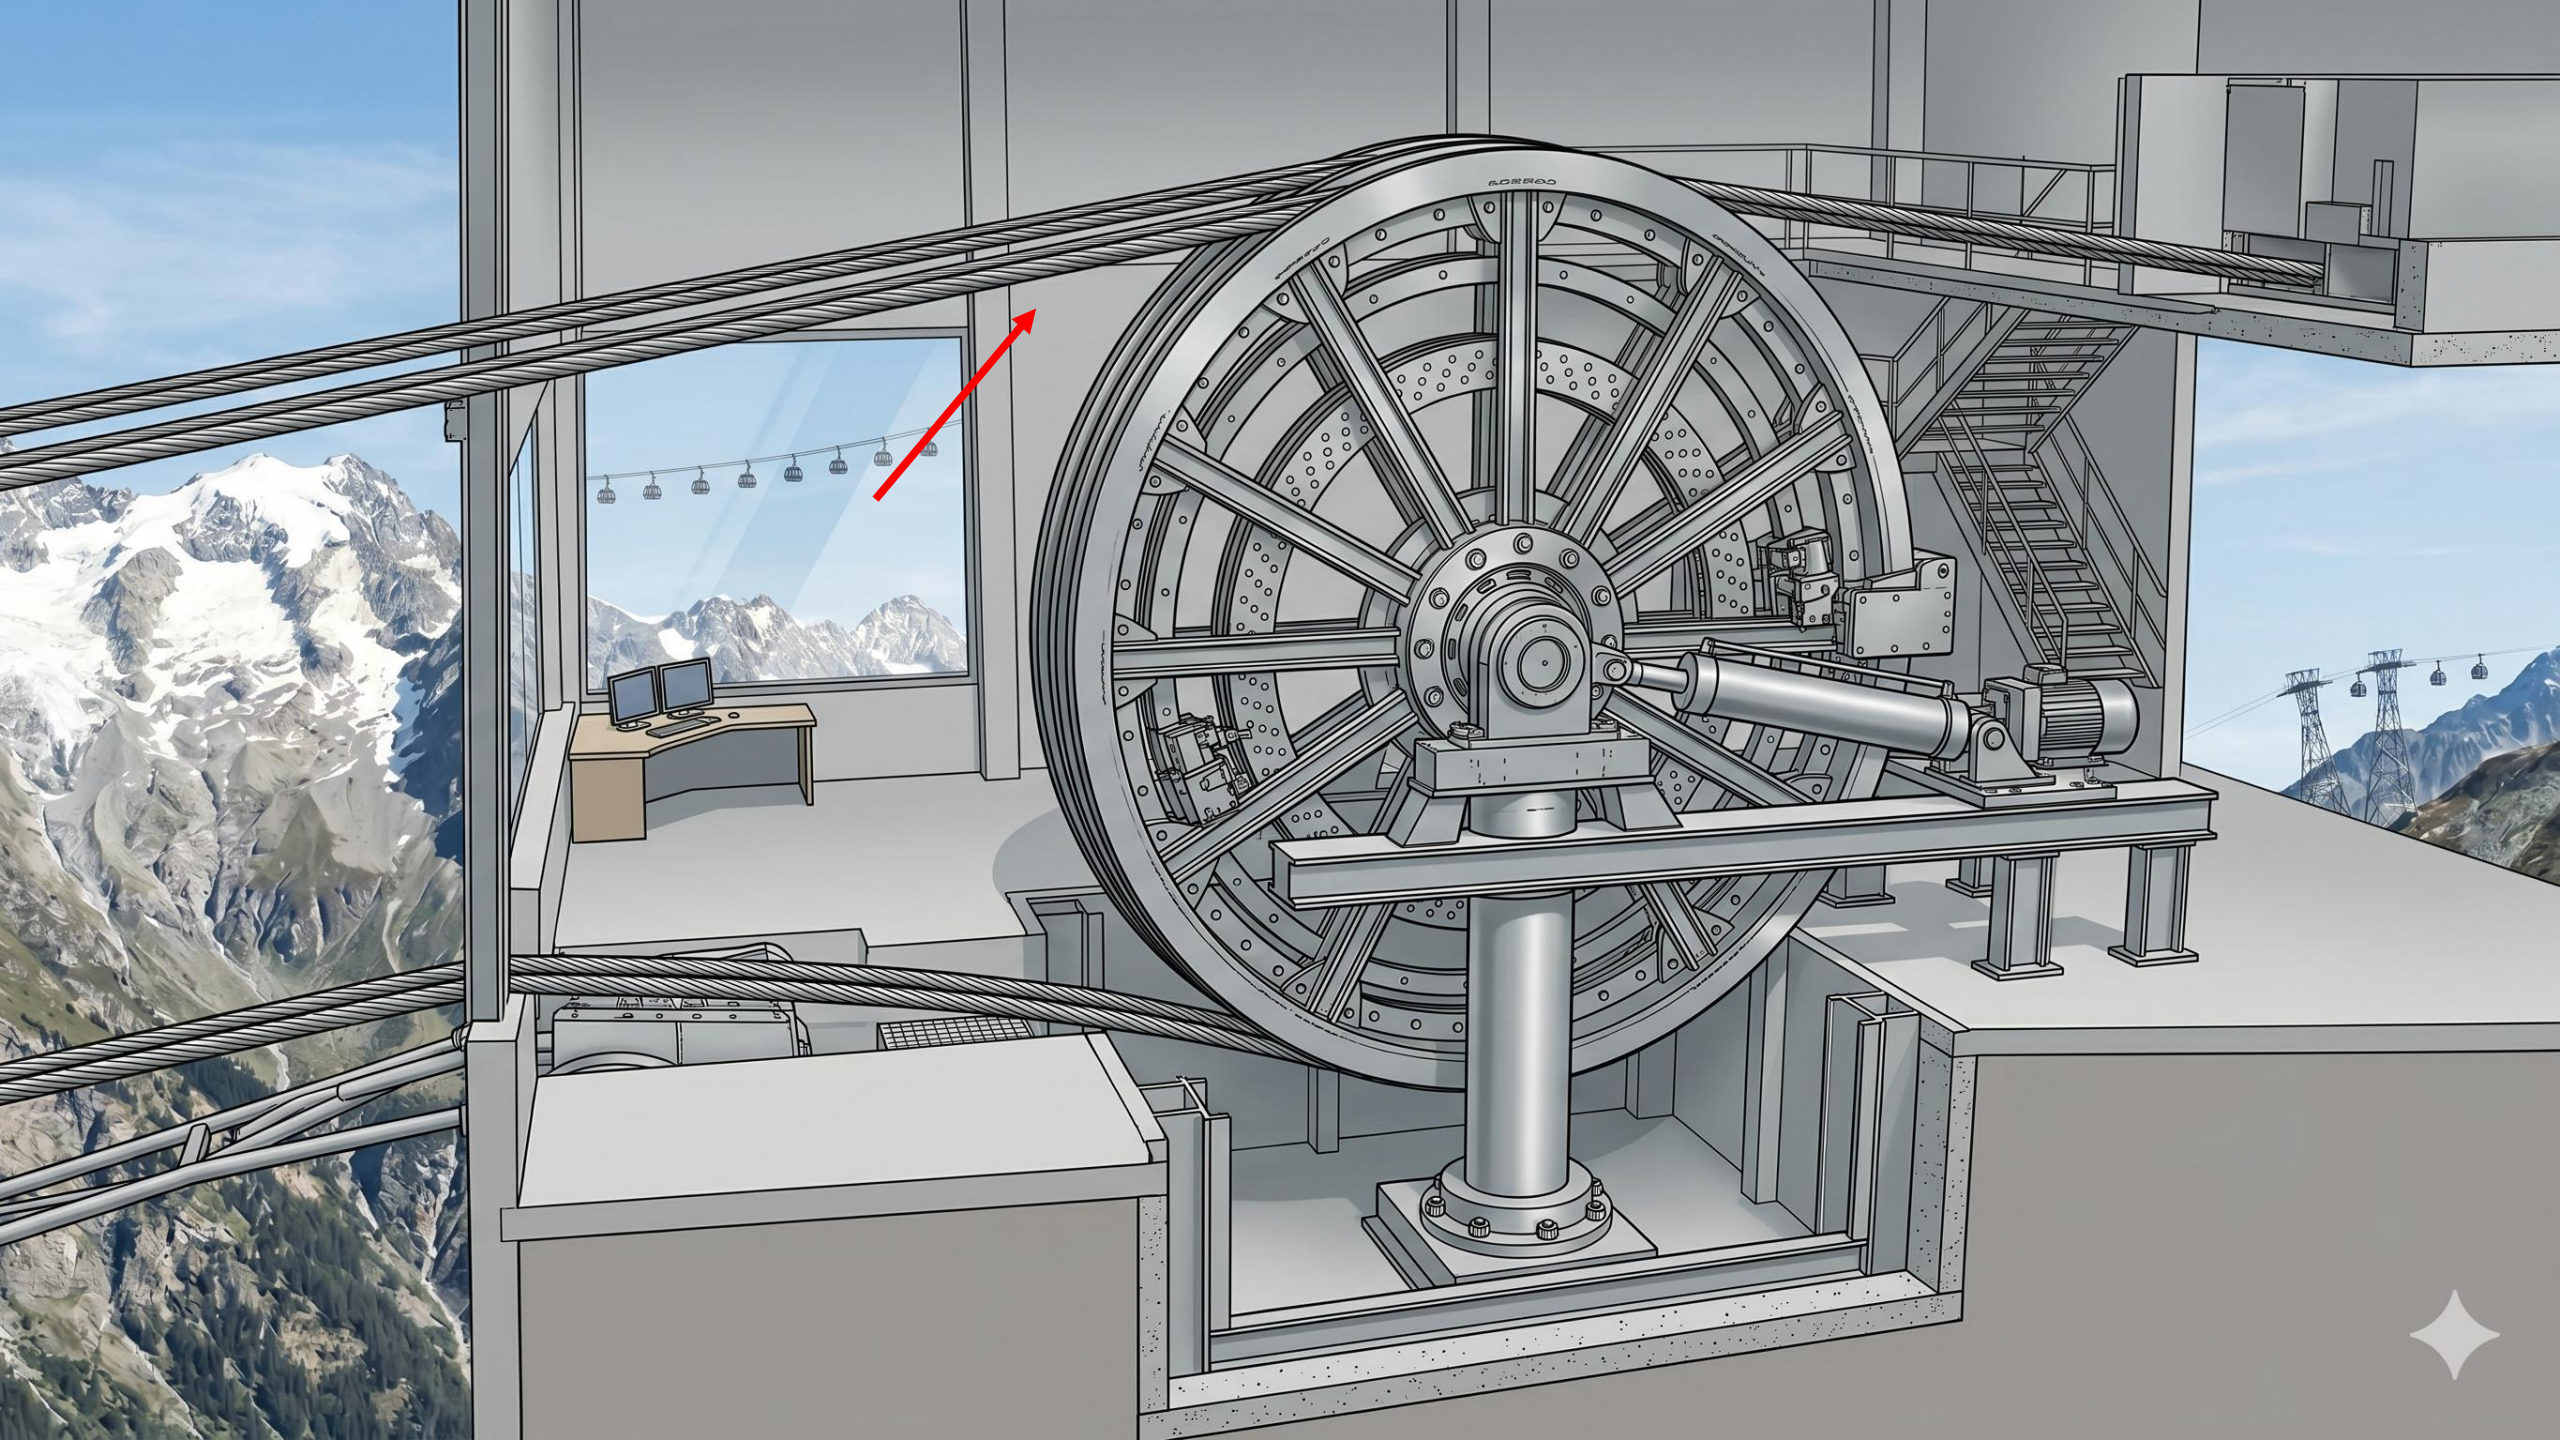



1. Transport public par câble
2. AURO (automatisé)
3. LHand
4. Arrêt simultané

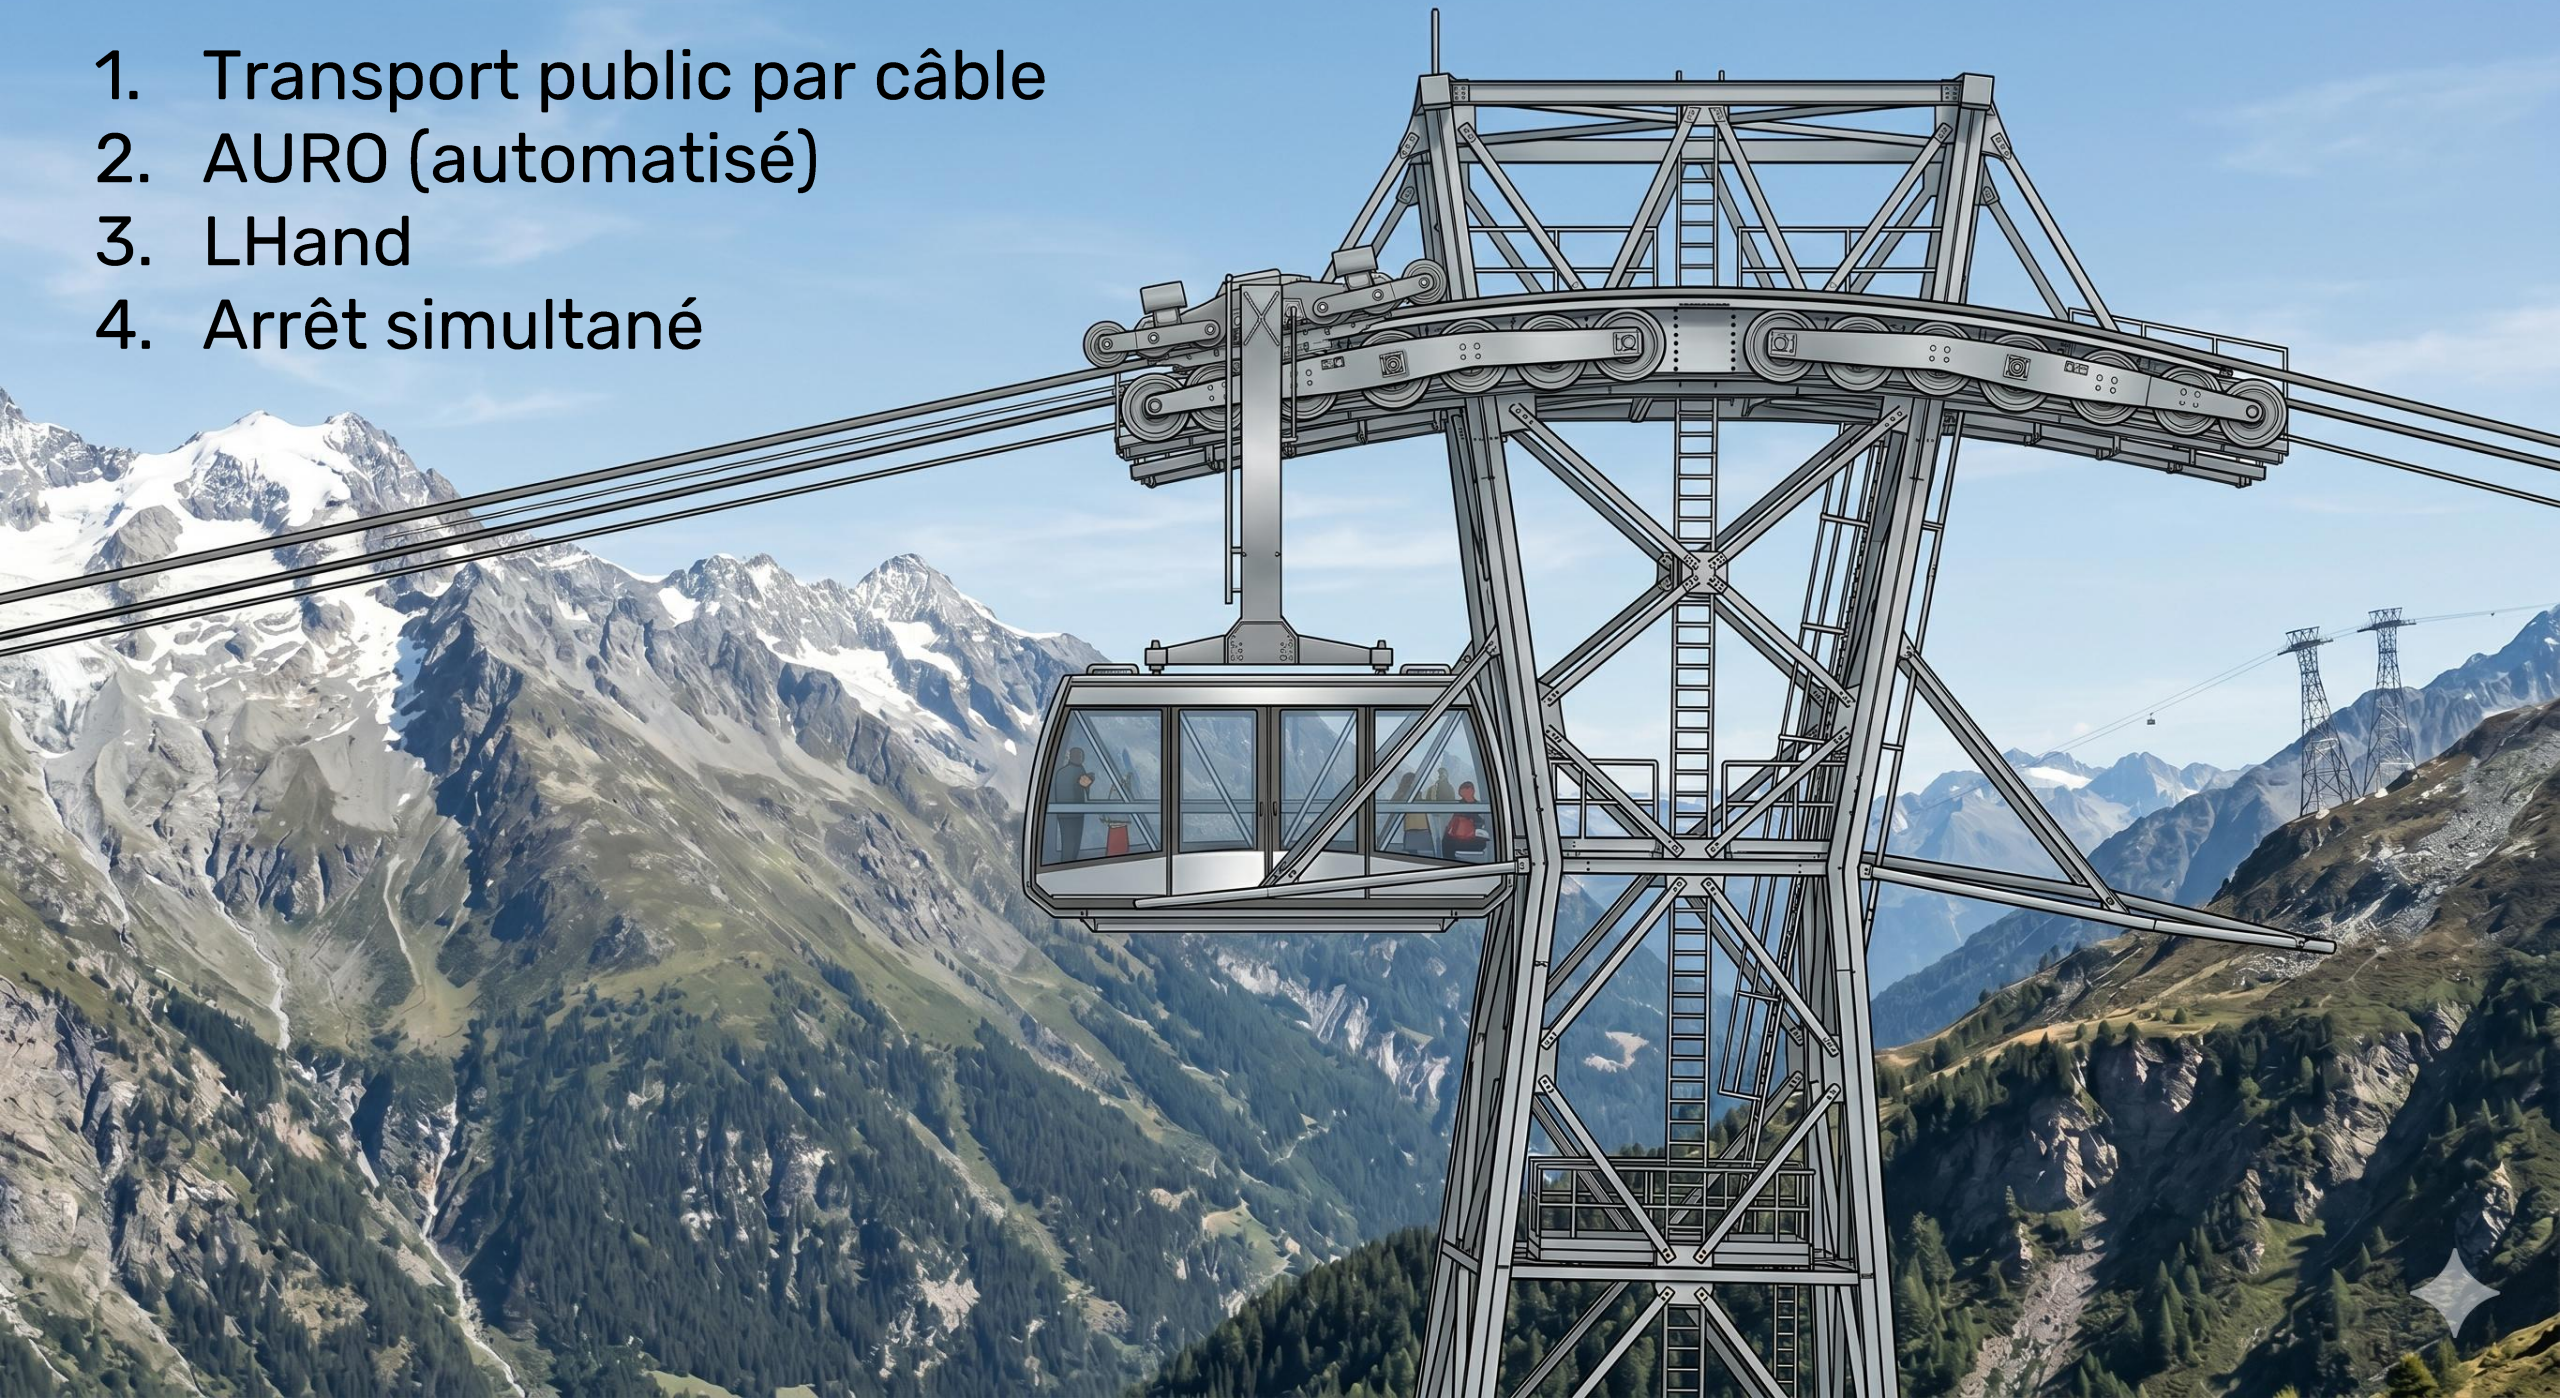

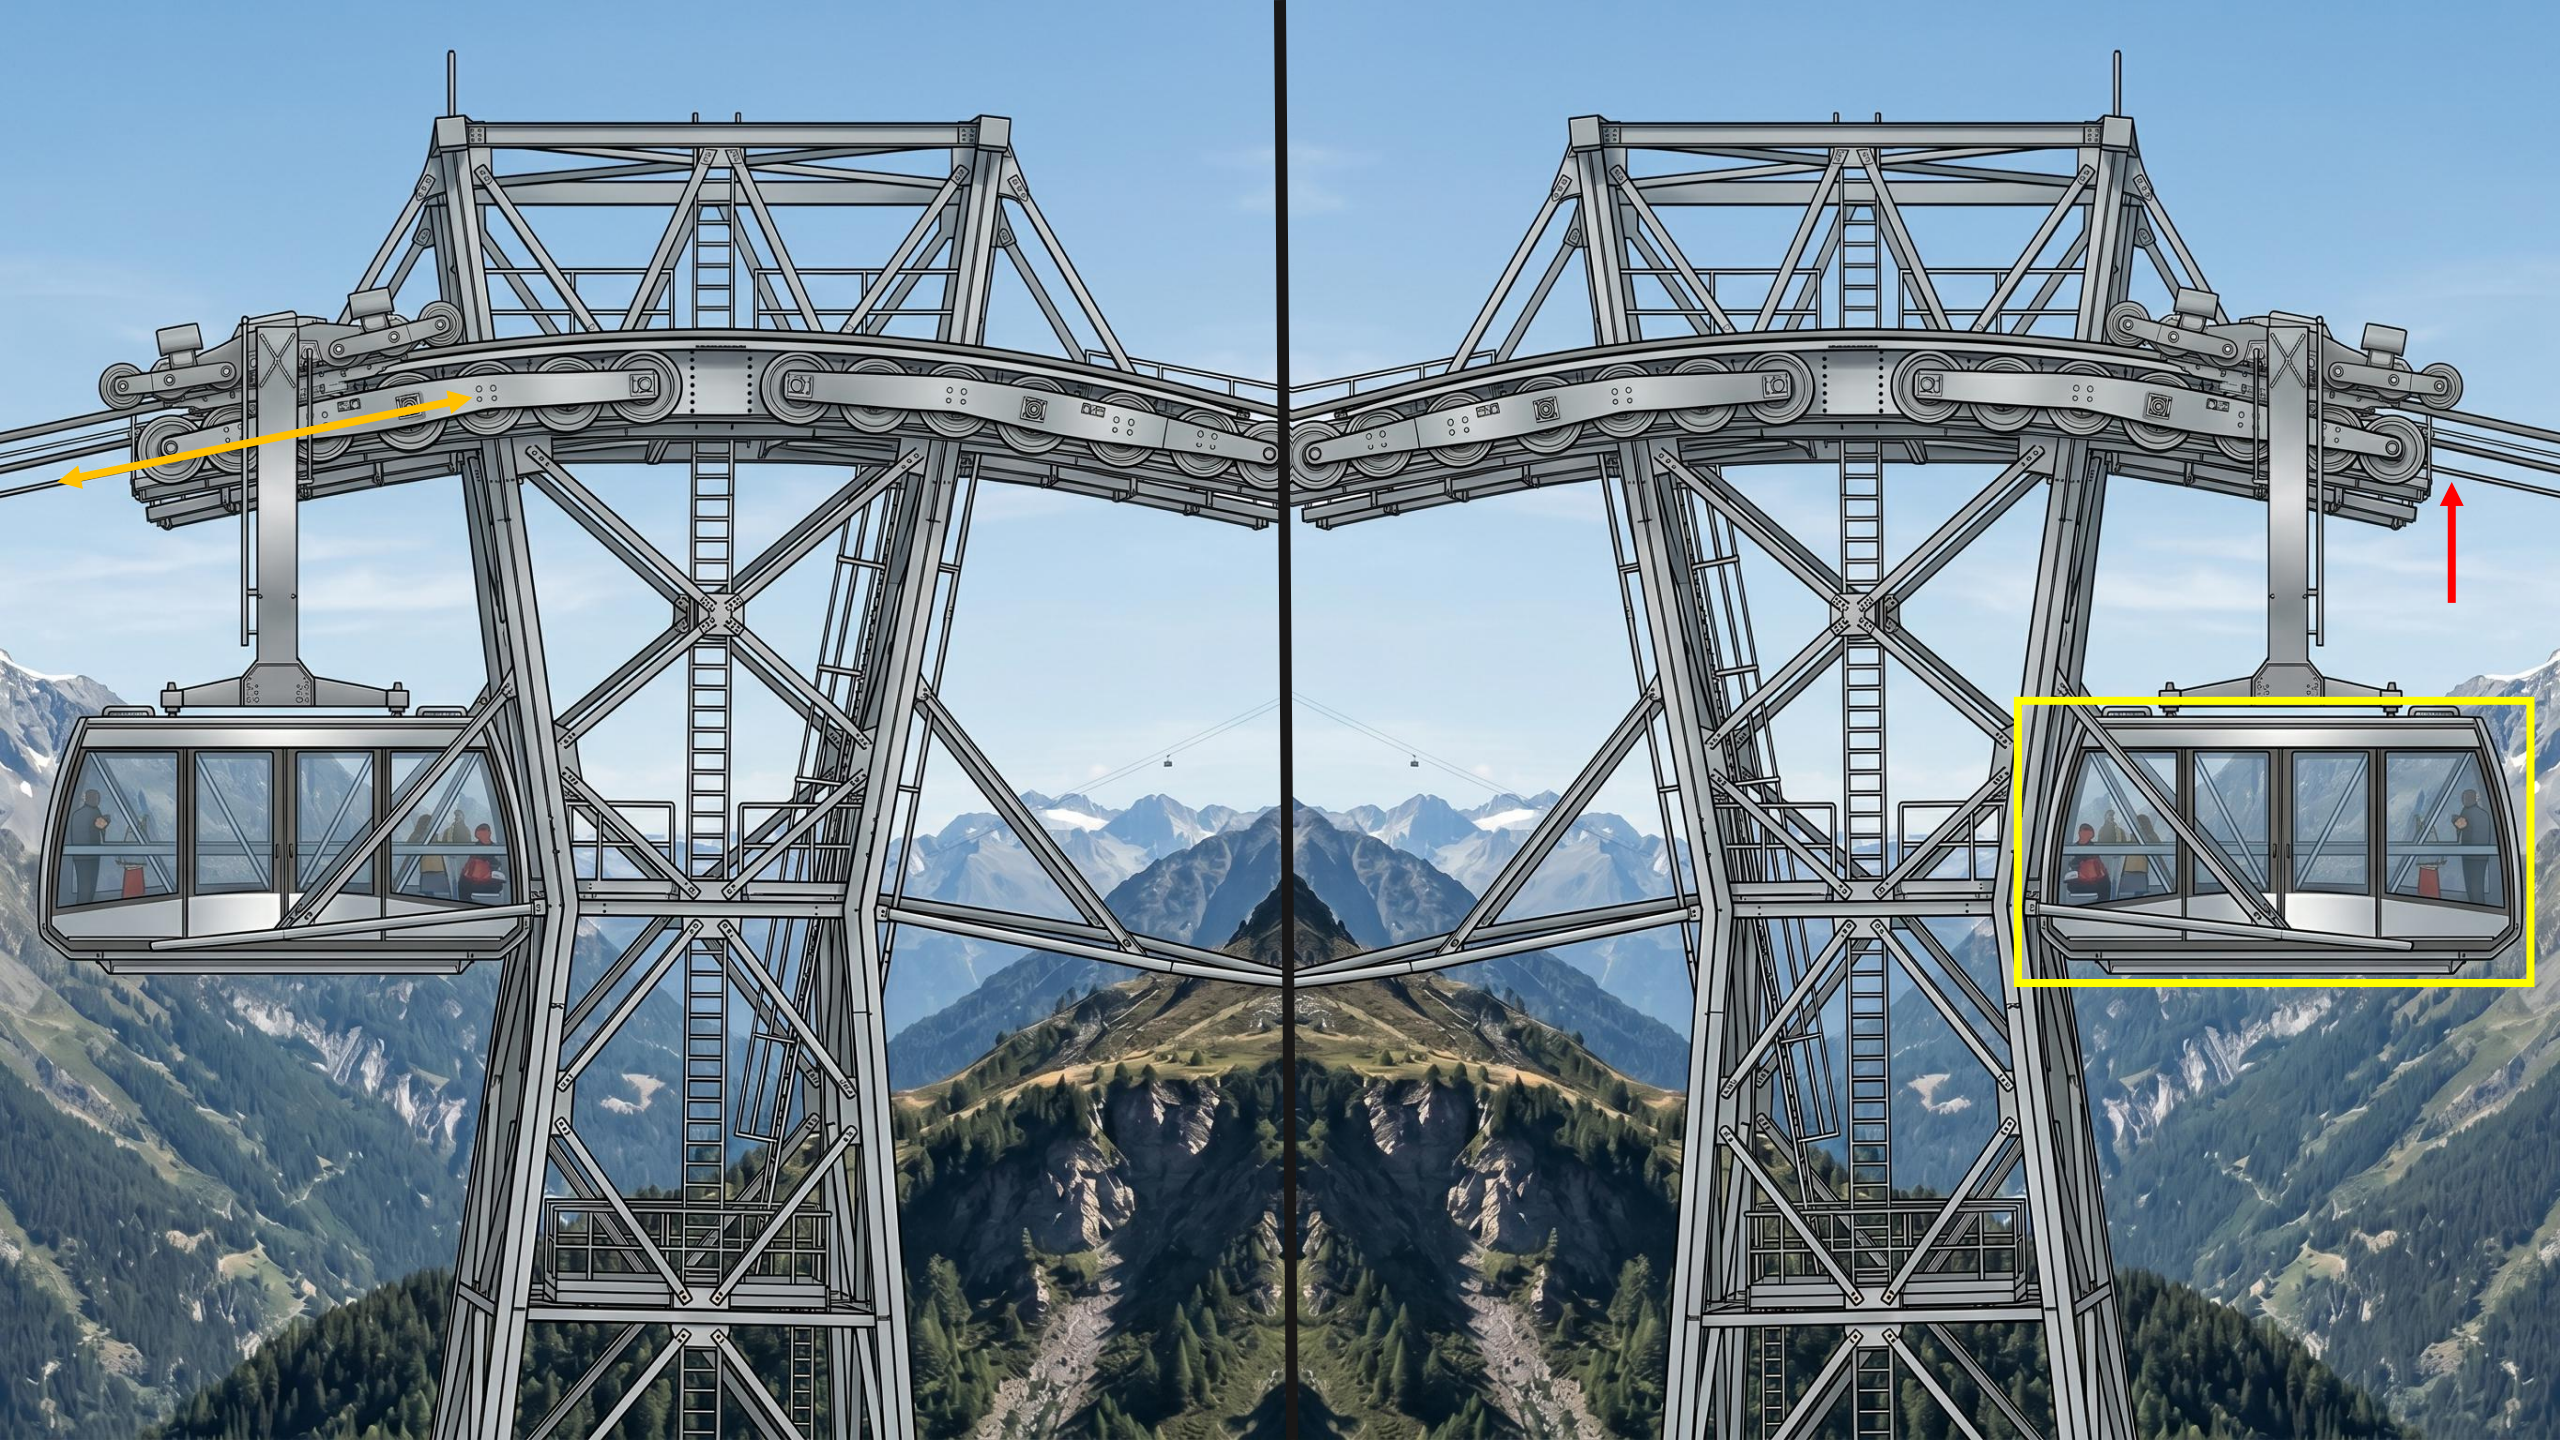

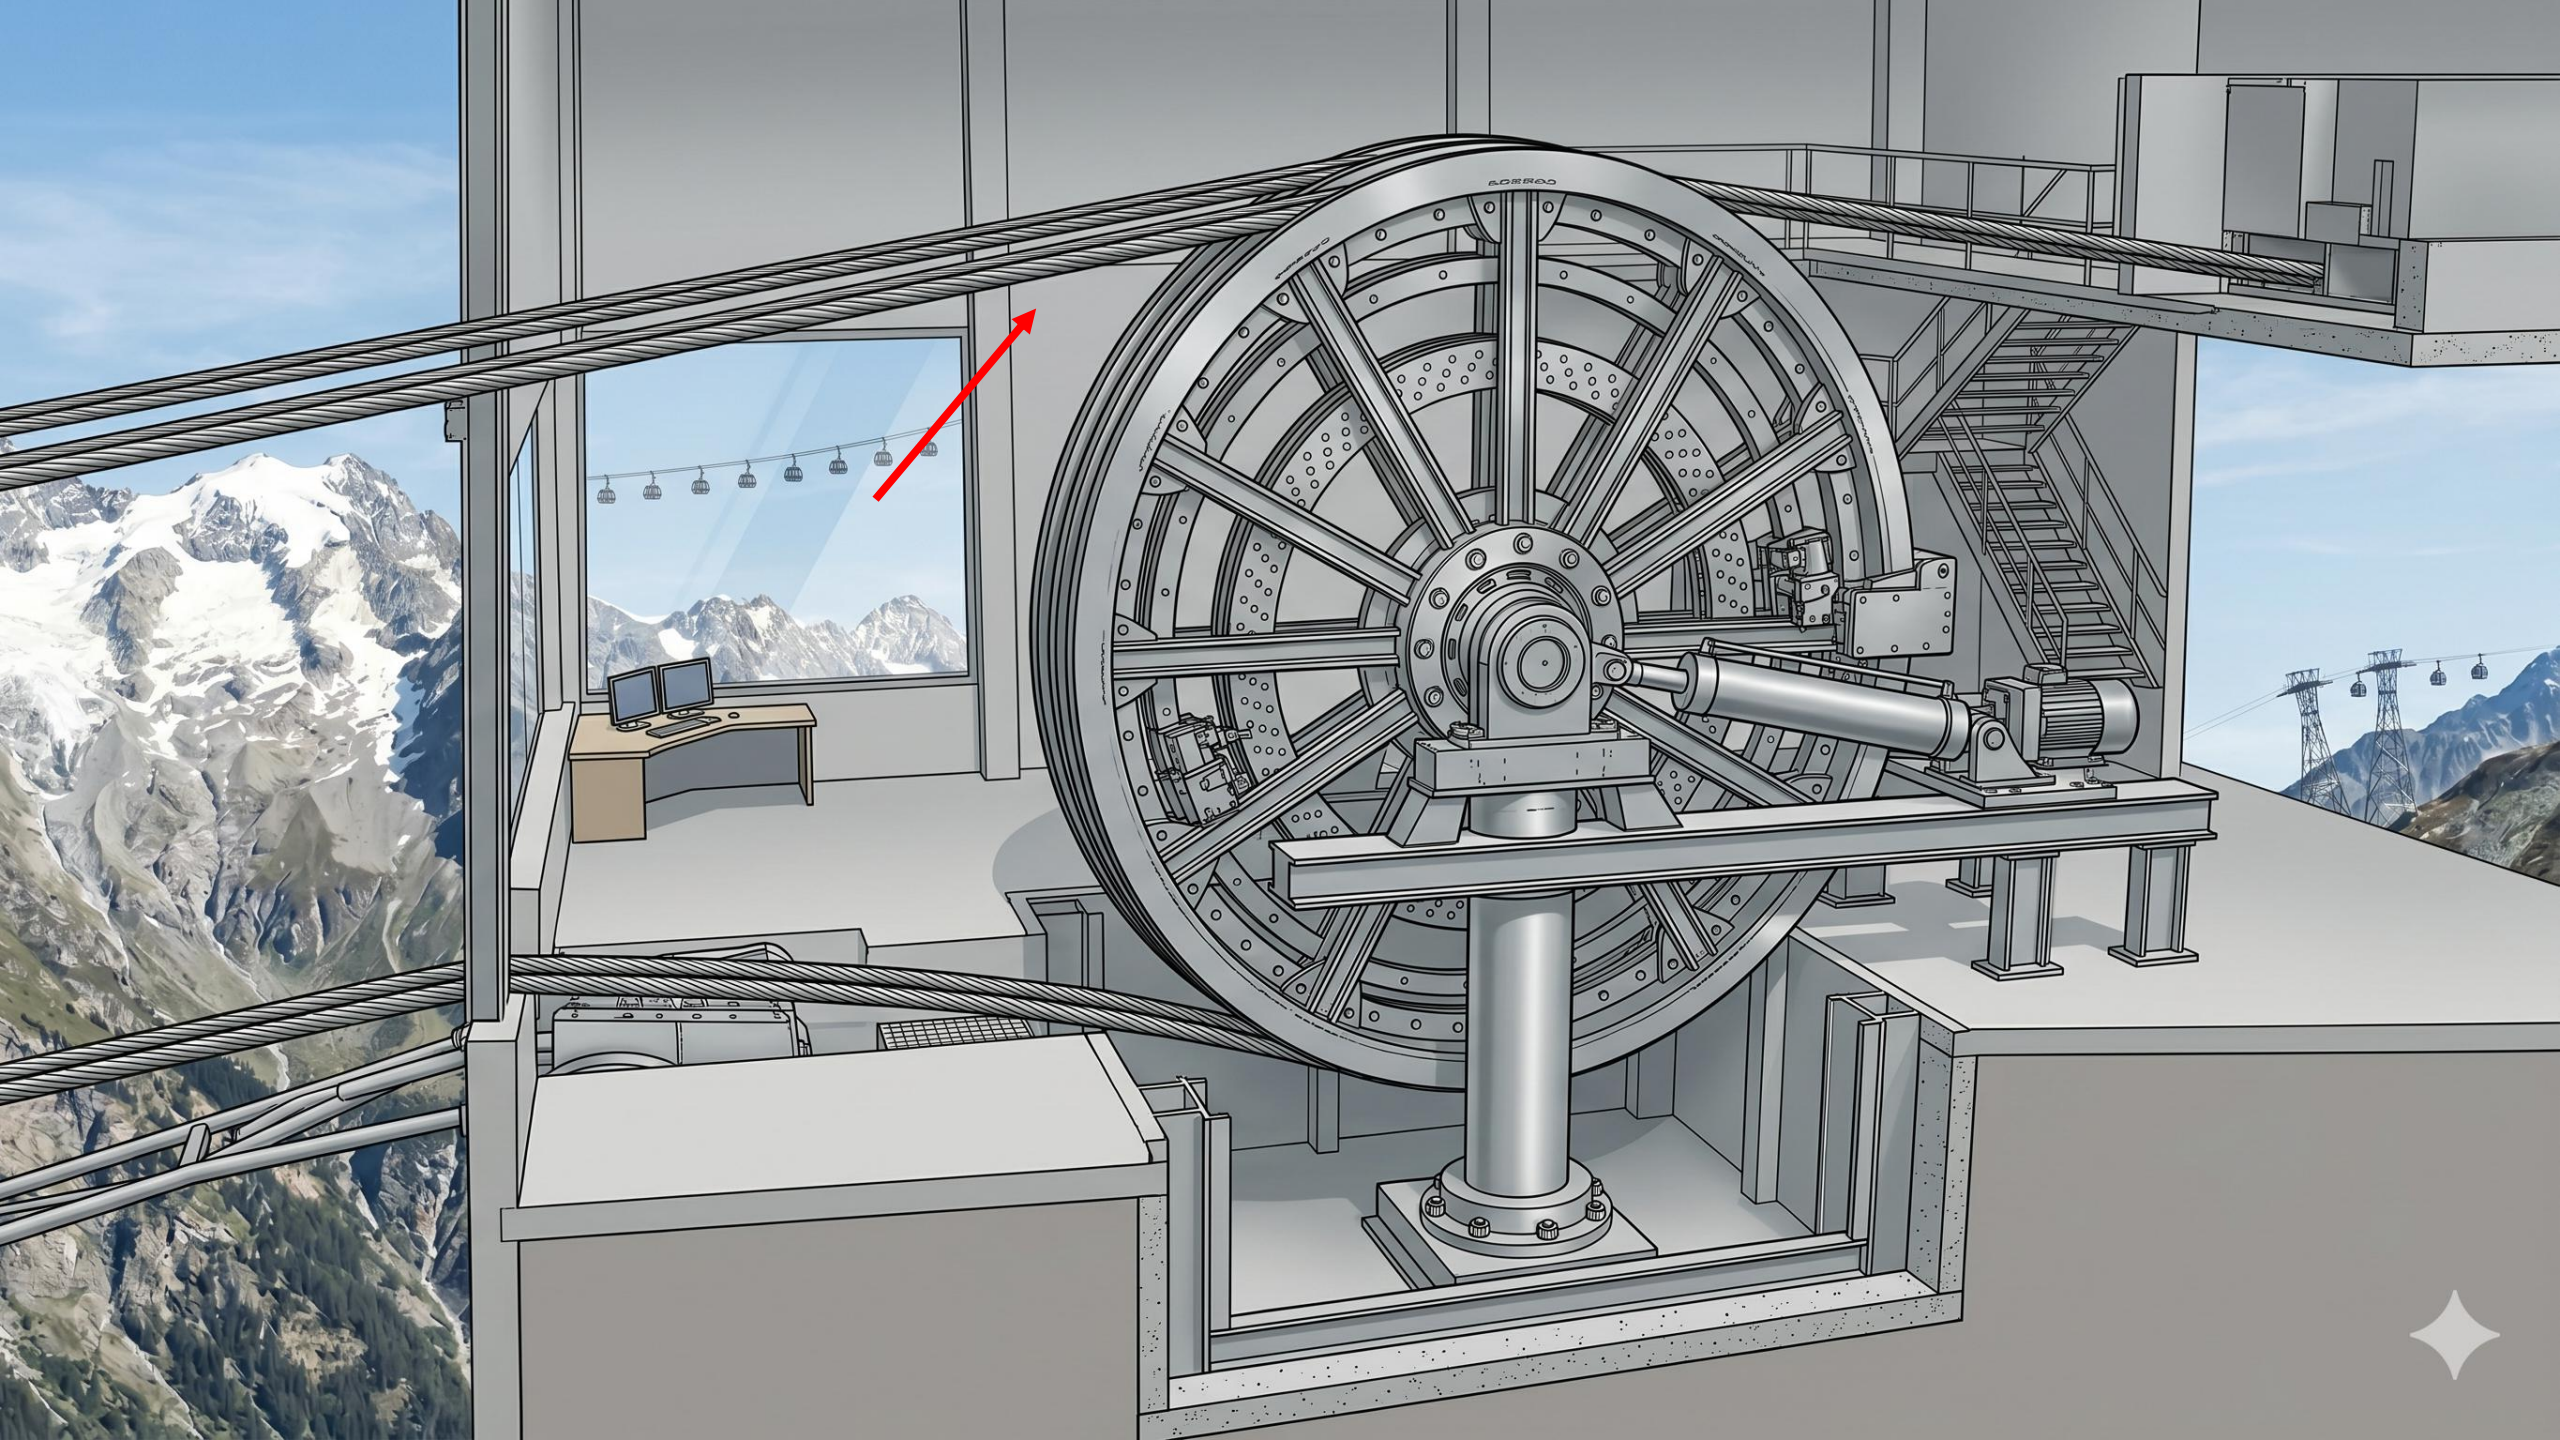

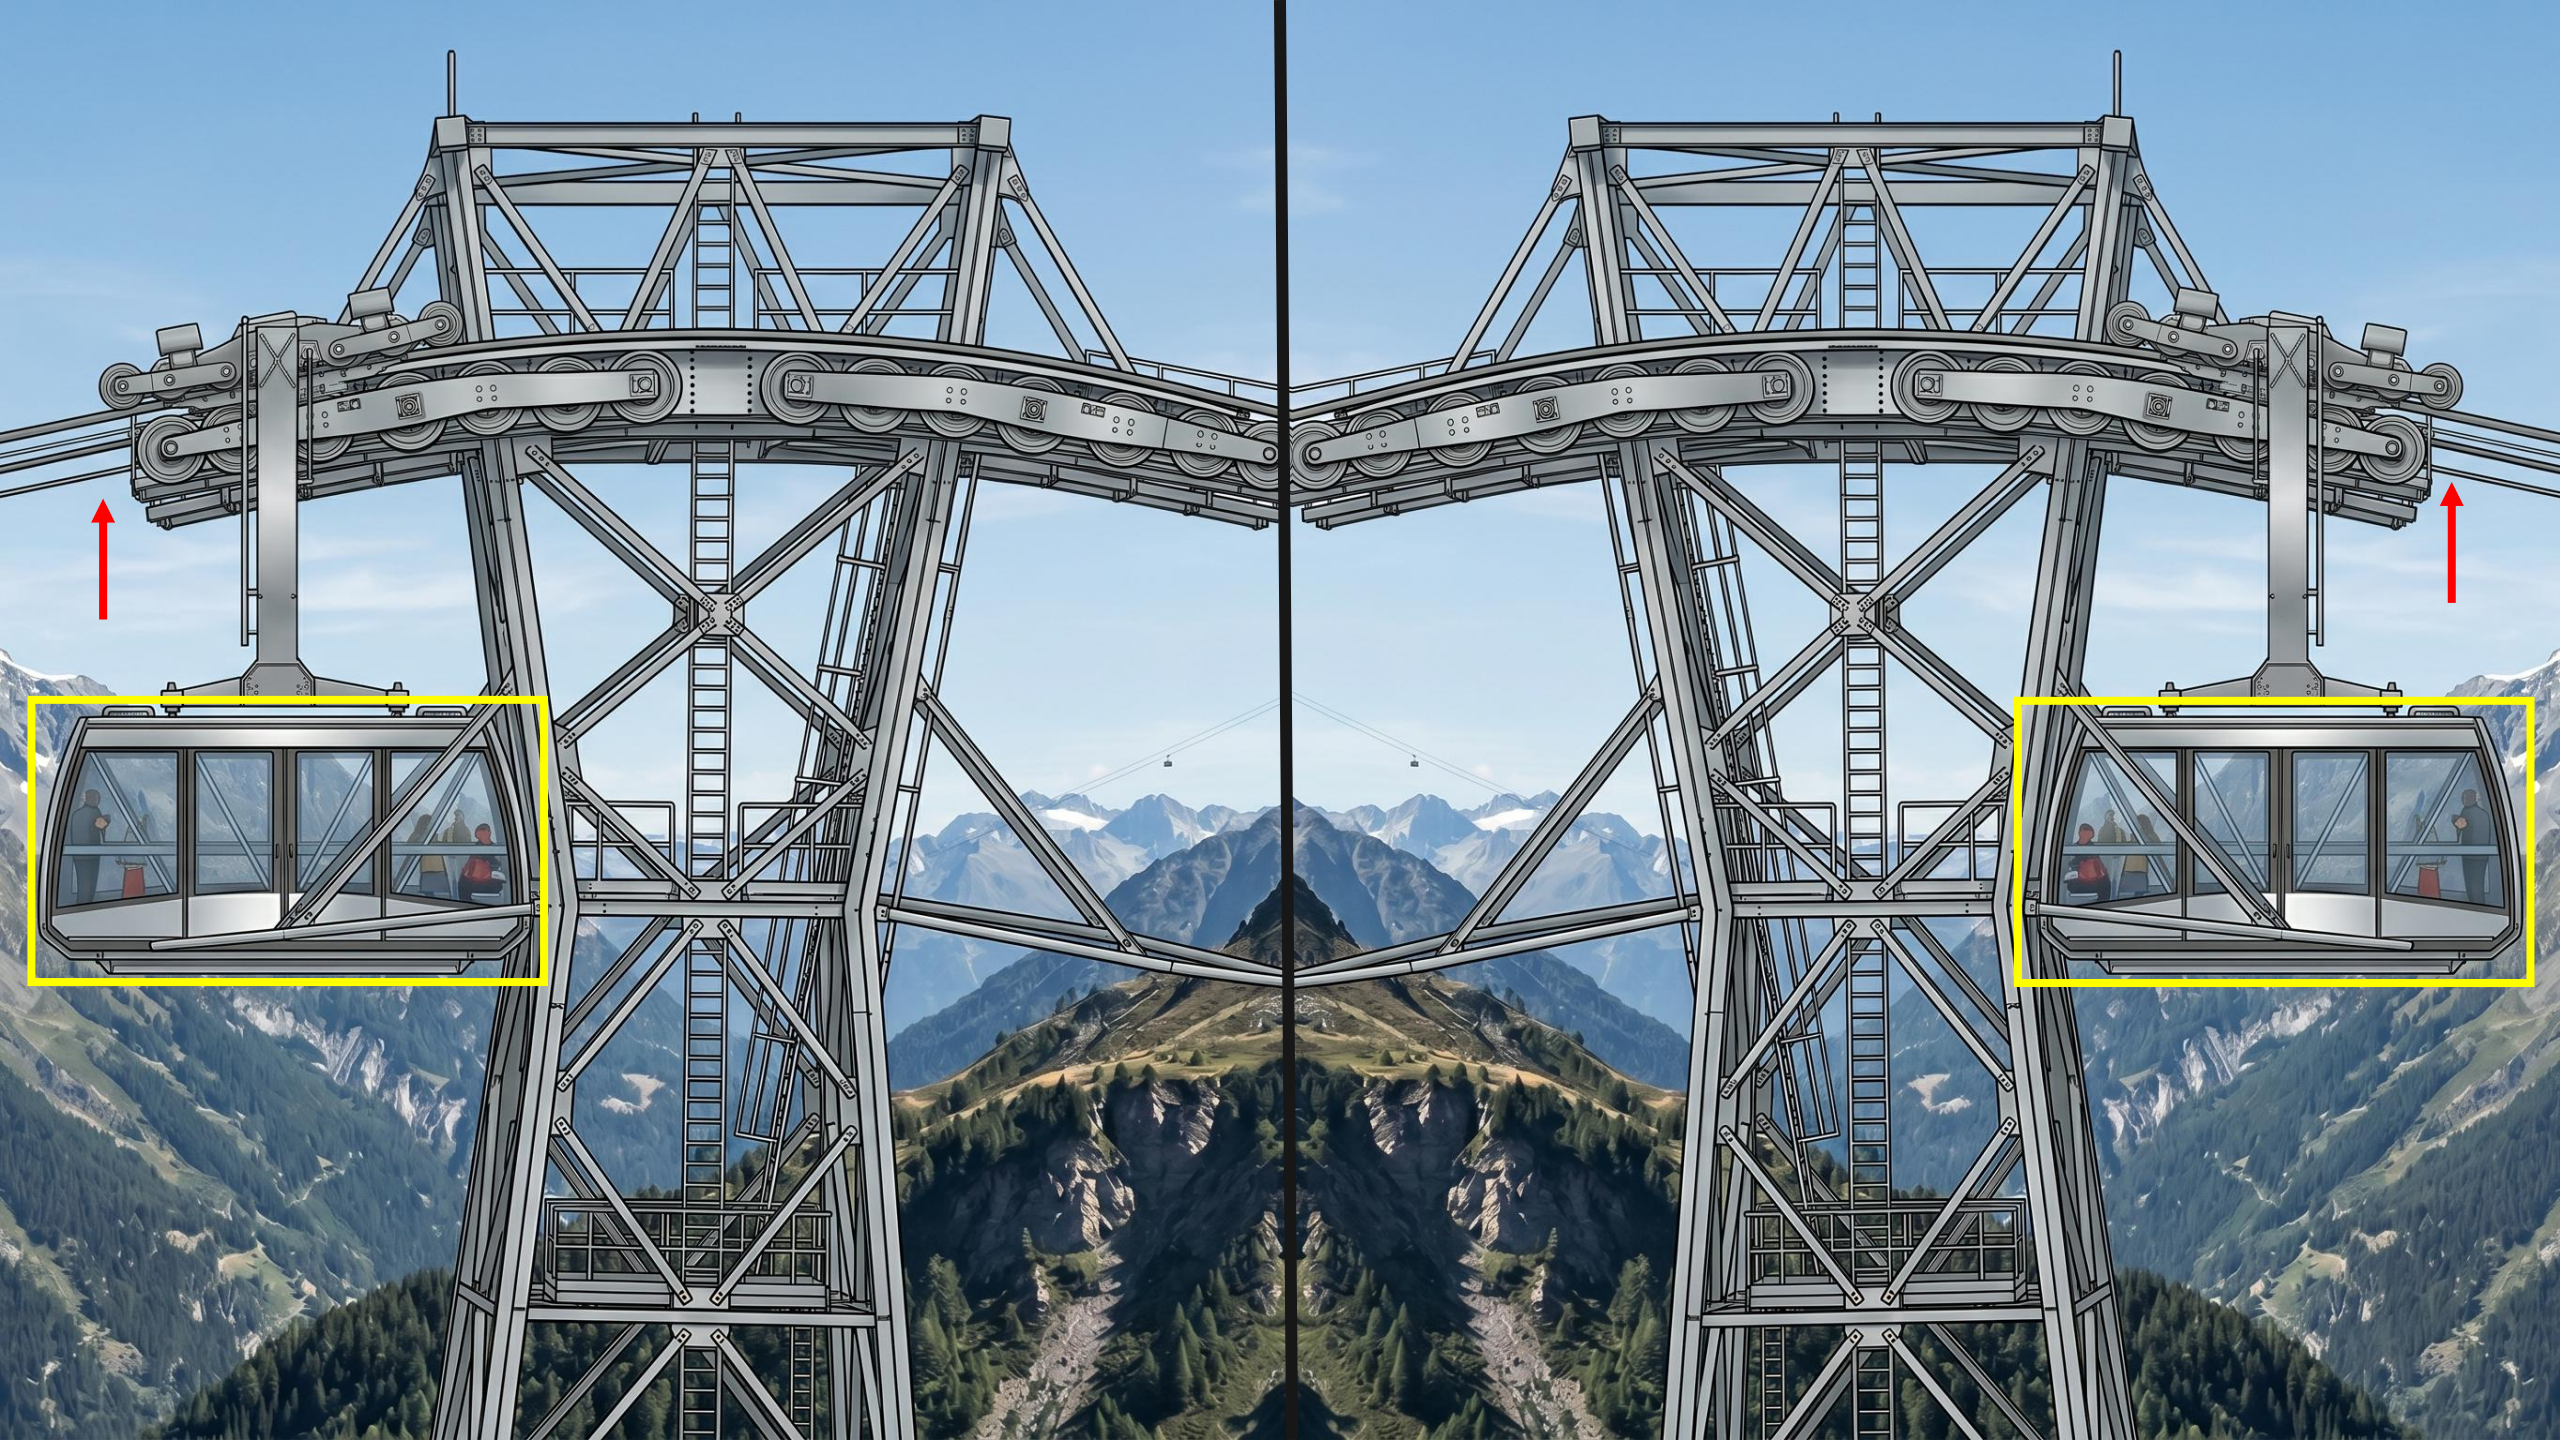

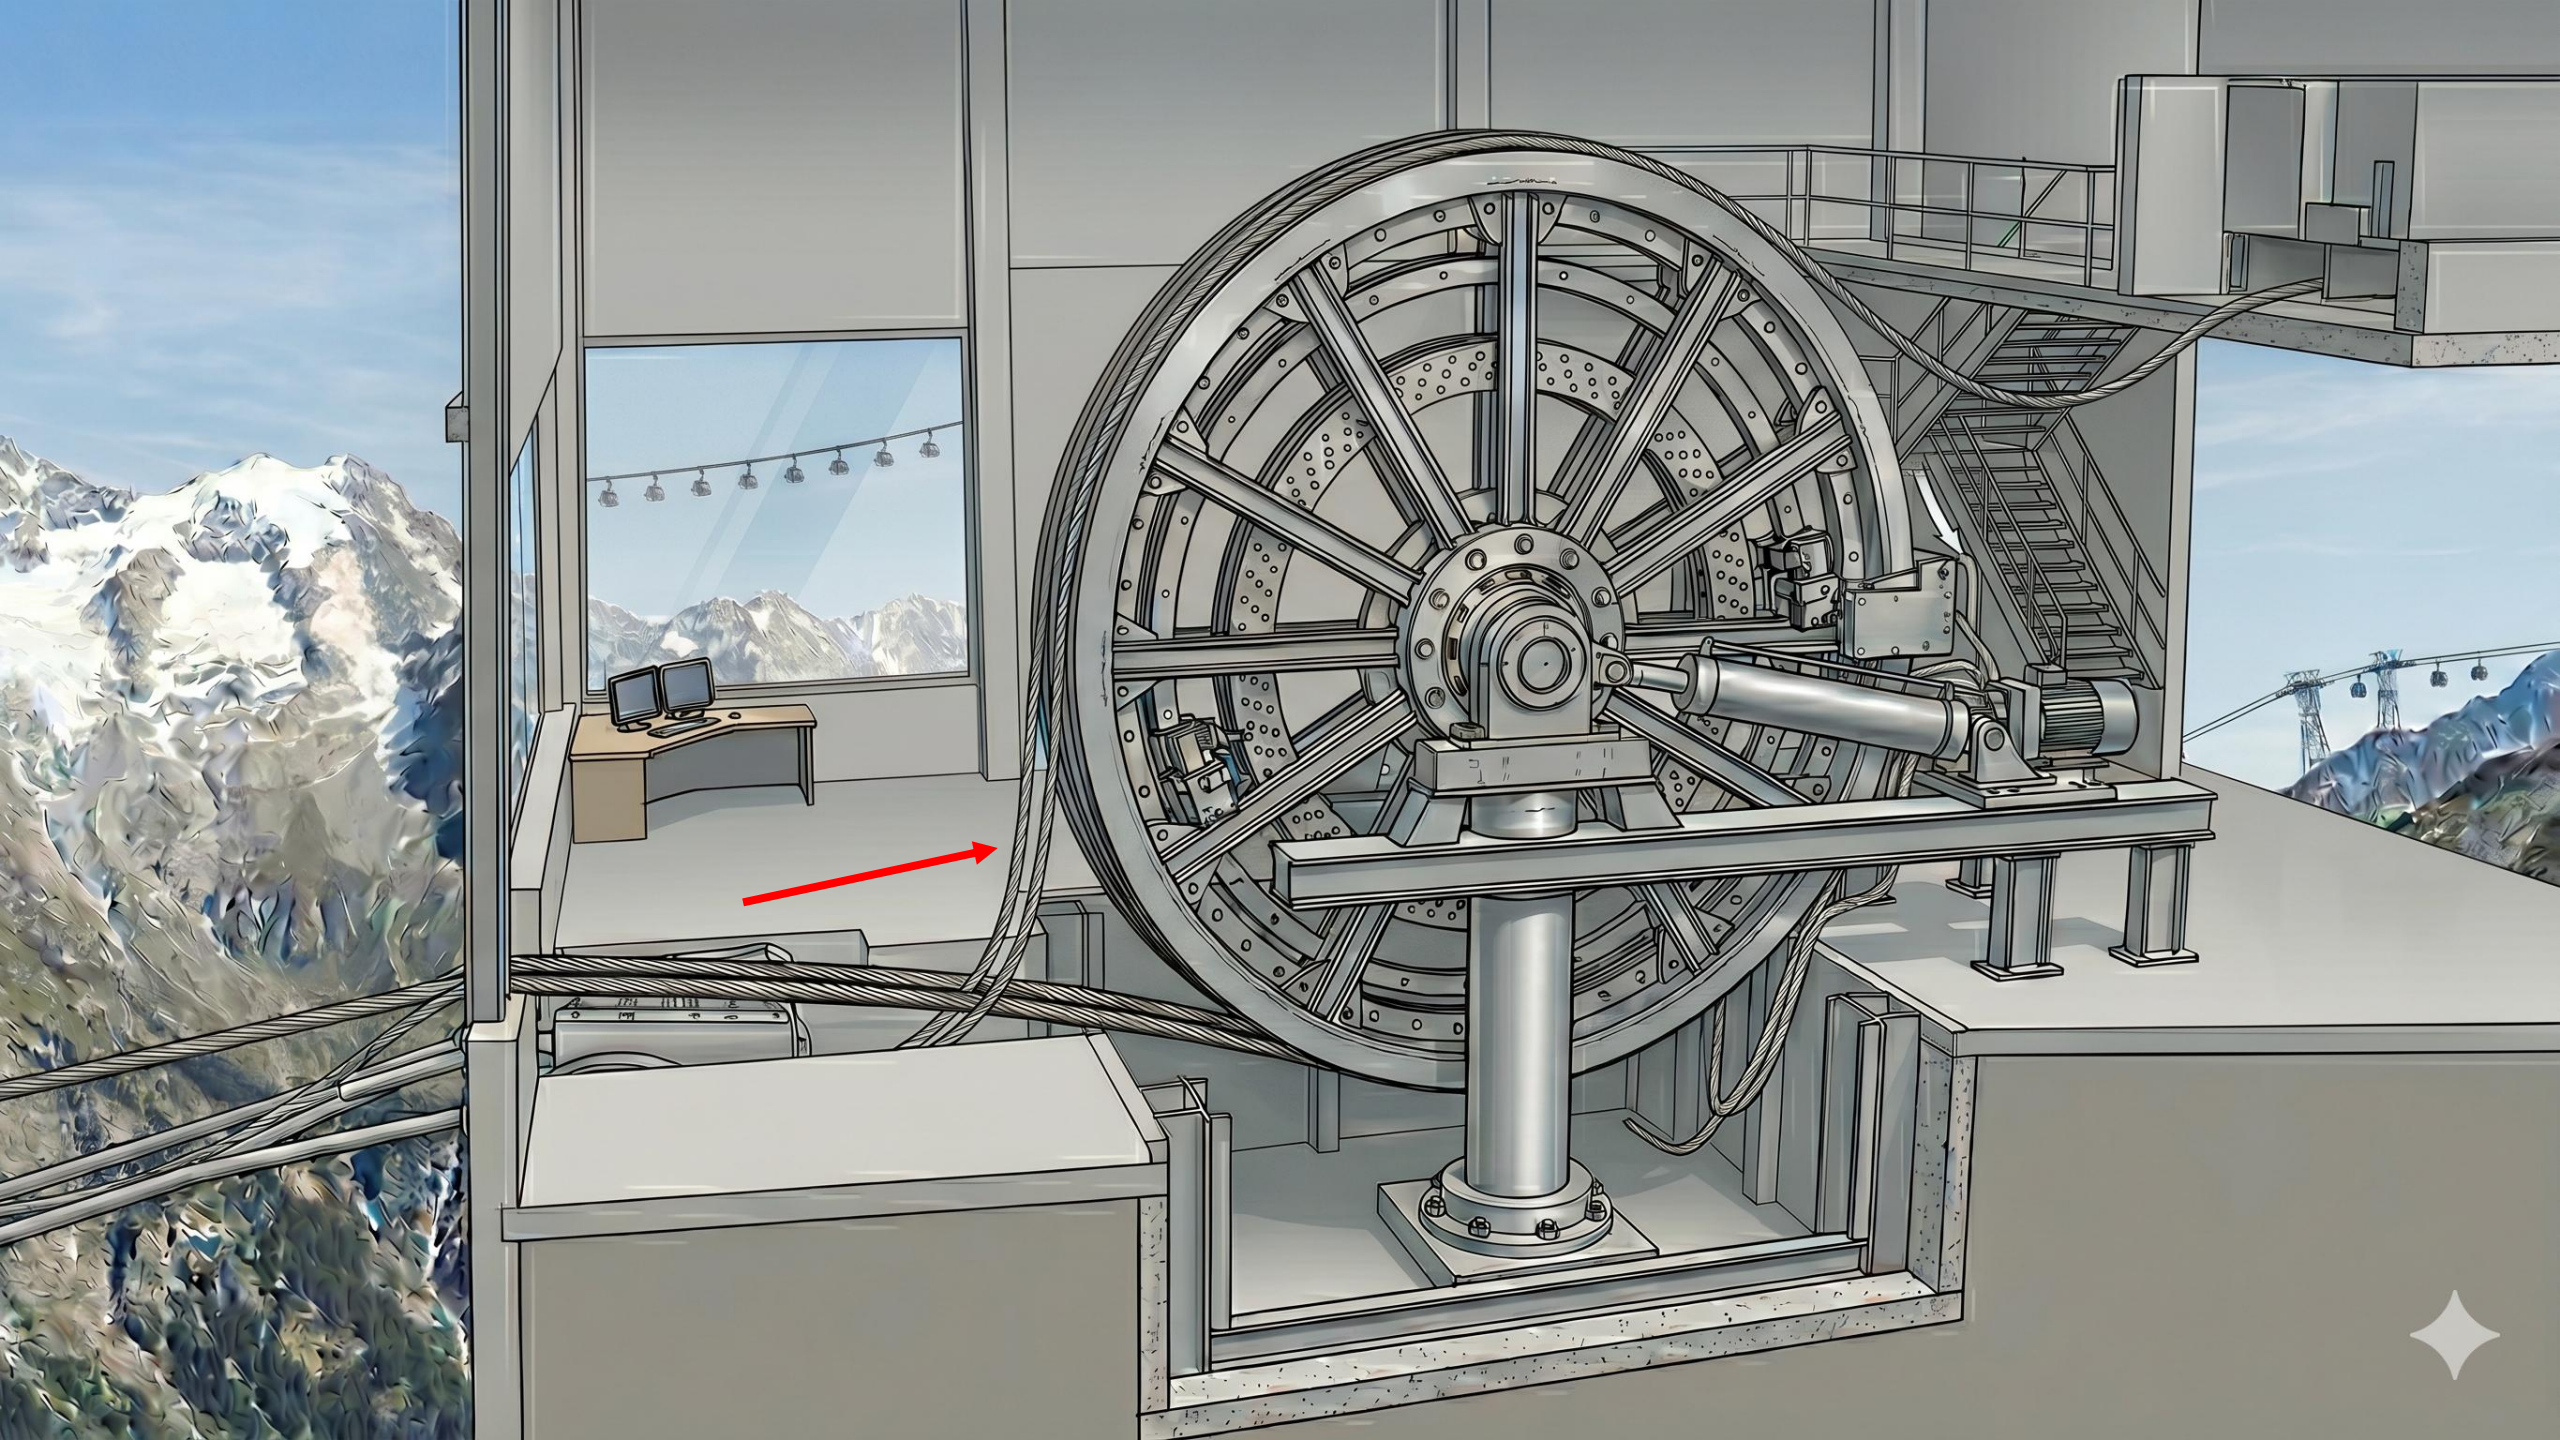

NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

SITUATION ACTUELLE

Dossier technique

- Dossiers complets déposés
- Compléments (expertise) demandés par l'OFT
- **Délai pour finaliser : 31/08**

Dossier financement

- 3 versions différentes déposées
- **Dossier finalisé**

Prochaines étapes

- Décision d'approbation des plans par l'OFT
- Décisions complémentaires de financement par le Canton et l'OFT

Coût du projet est passé de CHF 16 en 2018 à CHF 25 millions

NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

SUITE DE LA PROCÉDURE

	Sans recours	
	Mise en chantier	3-6 mois
	Chantier	9 mois
	Ligne Swissgrid à arrêter	
	3 mois installation hors service	
	Durée totale	12 - 15 mois

NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

SUITE DE LA PROCÉDURE

Avec recours		
Tribunal Adm. Fédéral	18-24 mois	
Tribunal Fédéral	9-12 mois	
Mise en chantier	3-6 mois	
Chantier	9 mois	
Ligne Swissgrid à arrêter		
3 mois installation hors service		
Durée totale	39 - 51 mois	

NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

SUITE DE LA PROCÉDURE

Avec recours		Sans recours	
Tribunal Adm. Fédéral	18-24 mois	Mise en chantier	3-6 mois
Tribunal Fédéral	9-12 mois	Chantier	9 mois
		Ligne Swissgrid à arrêter	
		3 mois installation hors service	
Mise en chantier	3-6 mois		
Chantier	9 mois		
Ligne Swissgrid à arrêter			
3 mois installation hors service			
Durée totale	39 - 51 mois	Durée totale	12 - 15 mois

SITUATION DU TÉLÉPHÉRIQUE

RÉSUMÉ DE LA SITUATION

- › Téléphérique actuel vétuste (remplacement prévu pour 2019)
- › Procédure de renouvellement plus longue que prévu
 - › **Remplacement d'équipements d'usure**
 - › **Coûts importants engagés**
- › Jusqu'à l'échéance de la procédure
 - › **Maintenir le service**
 - › **Limiter le temps**

QUESTIONS ?



Téléphérique Chalais Vercorin SA

Route d'Anniviers 1, 3967 Vercorin

+41 27 455 58 55

info@vercorin.ch
